E0 — Constitució de l'equip i divisió de tasques i rols

Projecte: Implantació d'un sistema informàtic de gestió de granges de pollastres (AviGest S.L.)
Data: 14 de setembre de 2026

Divisió de rols


	Joan	Mariam
Àrea principal	Infraestructura, xarxa i seguretat	Base de dades, IoT i automatització
Responsabilitats	Maquinari seu central i granges, LDAP (usuaris/grups centralitzats), DMZ i tallafocs, còpies de seguretat i PRD, redundància	Model Entitat-Relació i SQL, triggers i procediments emmagatzemats, decisió i integració IoT (LoRaWAN/RS485), scripts d'automatització d'alta de granges
Mòduls de l'enunciat	4.1, 4.2, 4.4, 4.5, 4.6	4.3, 4.7, 4.8

Tot i que el nombre de mòduls assignats no és idèntic (5 vs. 3), s'estima que la càrrega de treball és equivalent: el bloc de base de dades i IoT de Mariam (disseny ER, SQL, triggers, procediments emmagatzemats i integració de sensors) requereix un volum de feina i complexitat comparable al conjunt de tasques d'infraestructura, seguretat i continuïtat de Joan.

Les tasques transversals (memòria, diari de treball, fitxes de decisió, planificació/Gantt — mòdul 4.0, defensa oral) es fan sempre **a mitges o amb revisió creuada**.

El mòdul **4.extra (pàgina web d'administració)** és condicional ("només si tota la resta està acabat i funcionant"); no s'assigna responsable per endavant. Si el calendari ho permet, es decidirà el repartiment durant la fase d'execució (E5).

Diagrama de Gantt inicial

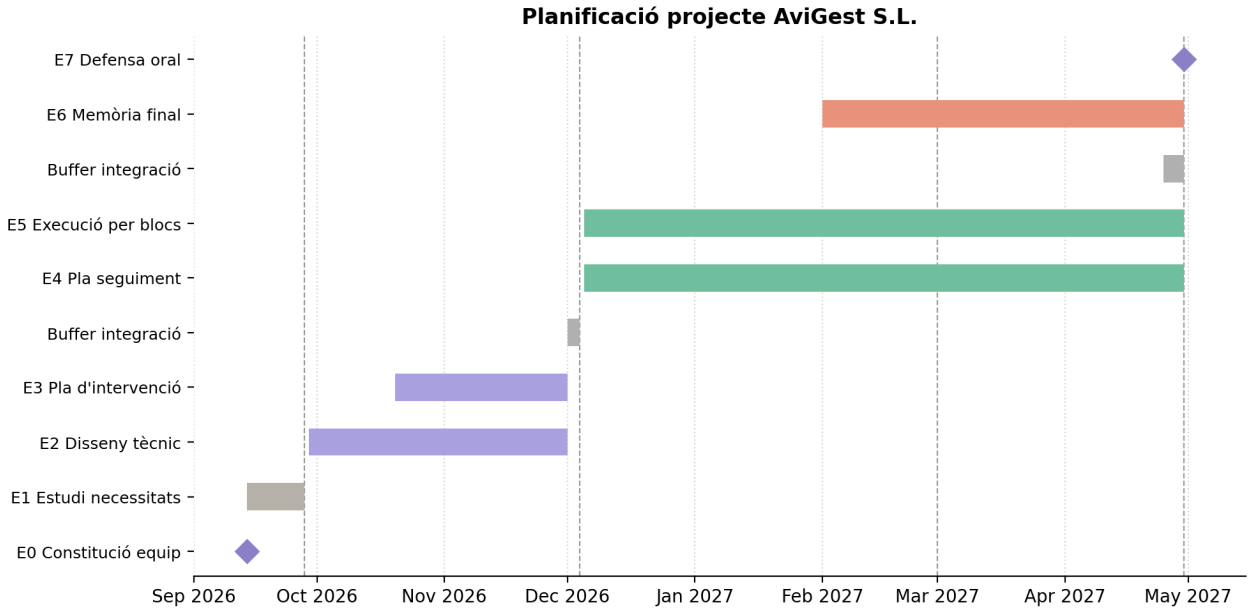

Fites clau: 28 set (E1), 4 des (E2/E3), 1 març (avenç E4/E5), 30 abr (entrega final i defensa). S'han afegit marges de 3-4 dies abans de les entregues grans (4 des i 30 abr) per integrar la feina de les dues àrees, i la redacció de la memòria final (E6) s'inicia progressivament des de febrer en lloc de concentrar-se només als últims dies.

Regla de funcionament

- Cadascú porta la seva àrea **end-to-end** a totes les fases (disseny → execució), no repartiment per fases.
- Sprints de 2 setmanes, alineats amb el lliurament quinzenal del diari de treball.
- Tauler de tasques a GitHub Projects, sincronitzat amb el repositori.
- Repositori Git amb branques per àrea (`infra/`, `bd/`, `iot/`) i merges freqüents a `main`.
- Fitxa de decisió tècnica abans d'implementar qualsevol component clau.
- Reunió curta de sincronització un cop per setmana.
- Marge de 3-4 dies abans de cada entrega gran per integrar les dues parts.

Sprint 1 (14–28 setembre) — Objectiu: E1, Estudi de necessitats

Tasca	Responsable
Anàlisi del sector avícola i de la digitalització de granges	Tots dos
Identificació de necessitats del client (AviGest i les granges)	Tots dos
Recerca de projectes/solucions similars existents al mercat	Tots dos
Definició de l'abast del projecte	Tots dos
Disseny del logo de l'empresa (AviGest S.L.)	Tots dos
Preparació de les 2 diapositives (què han comparat / què faran)	Tots dos
Configuració del repositori Git (estructura de carpetes, branques)	Joan

Creació del document/full compartit del diari de treball	Mariam

Declaració d’ús d’IA

- **Eina:** Claude (Anthropic)
- **Per a què:** organitzar tasques, elaborar el Gantt inicial i l’estructura del repositori, i revisar la coherència del document E0 amb l’enunciat del projecte
- **Verificació:** hem comprovat manualment que les dates, els pesos (%) i els entregables de cada fase coincideixen amb els de l’enunciat oficial, i que la divisió de rols i tasques reflecteix la que vam acordar oralment com a equip
